

越前町役場 新庁舎

いよいよ本格的に

新庁舎建設工事が始まります

庁舎建設の工事期間は、約15か月、新庁舎が完成し、役場機能移転後には、現庁舎の解体工事、駐車場、融雪、構内通路などの外構工事を含めた敷地内整備が必要になることから、事業完了までには約2年かかります。

※工事スケジュール図の矢印(赤色)は車両などの通行路および進入口です。
 ※敷地北側の交差点は、四差路から三差路になります。時期については、予告板などで事前にお知らせします。あらかじめご了承ください。


今後の新庁舎整備内容

区分	項目
建設工事	役場庁舎
	公用車車庫
外構工事	既存構造物撤去
	排水路
	融雪設備
	外灯
	駐車場
	構内通路
解体工事	現庁舎
	公用車車庫(一部)
その他	システム等移設
	備品購入・設置

工事スケジュール

① 役場新庁舎の建設工事と周辺構造物の撤去と新庁舎前の駐車場を含めた一部外構を行います。なお、生涯学習センター正面玄関が工事範囲に含まれていますが、新庁舎2階と生涯学習センターを渡り廊下で接続するための工事期間は、正面玄関が利用できなくなる予定です。時期については、広報えちぜんや町ホームページでお知らせします。


予定期間：2019年3月～2020年6月

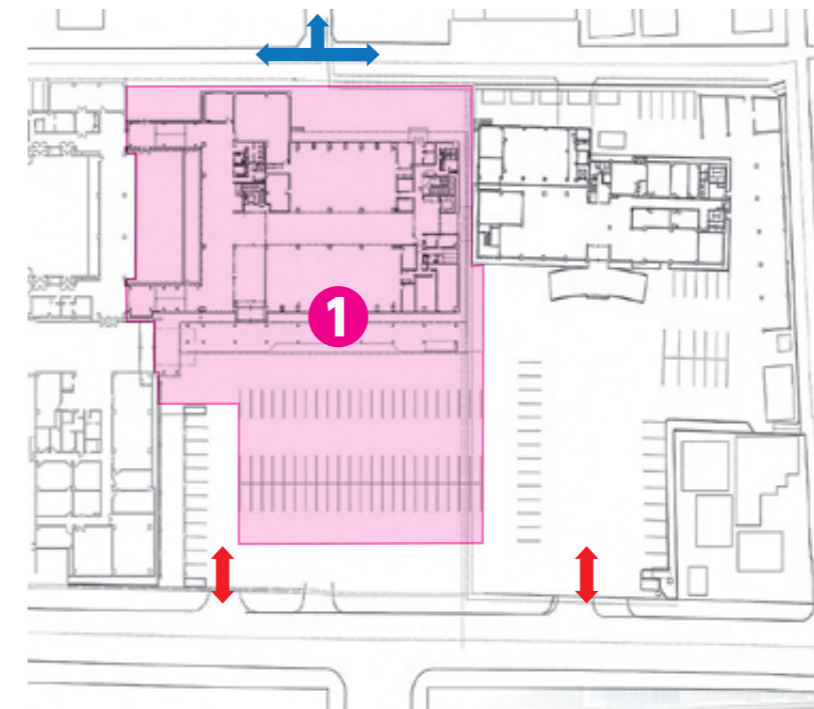

工事スケジュール

- ② 現庁舎の解体工事と現庁舎周辺構造物の撤去工事を行います。
- ③ 役場新庁舎の国道側の駐車場等の外構工事を行います。


予定期間：2020年6月～9月

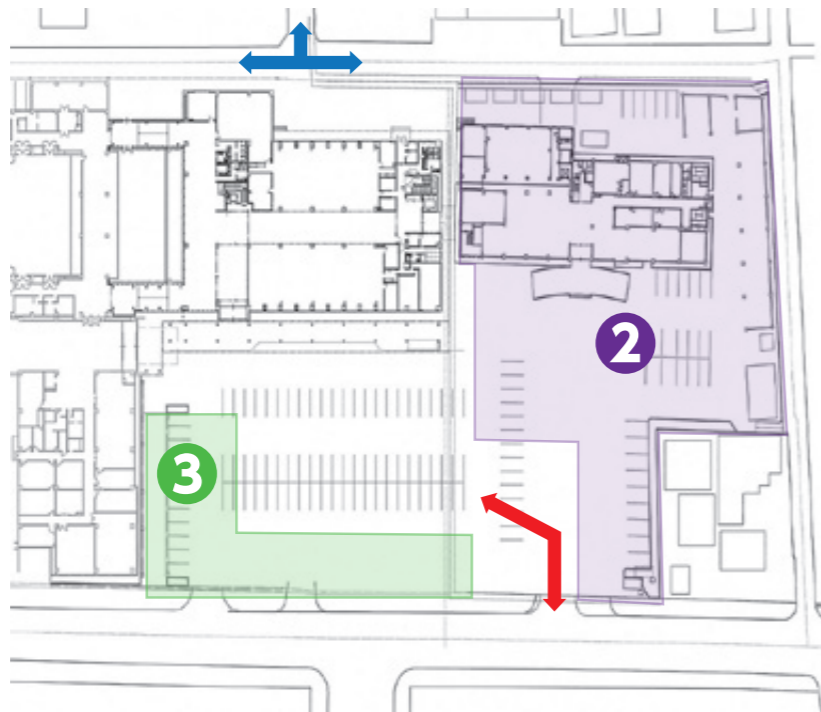

工事スケジュール

- ④ 公用車車庫の建設工事と駐車場や構内通路等の外構工事を行います。

予定期間：2020年10月～2021年3月

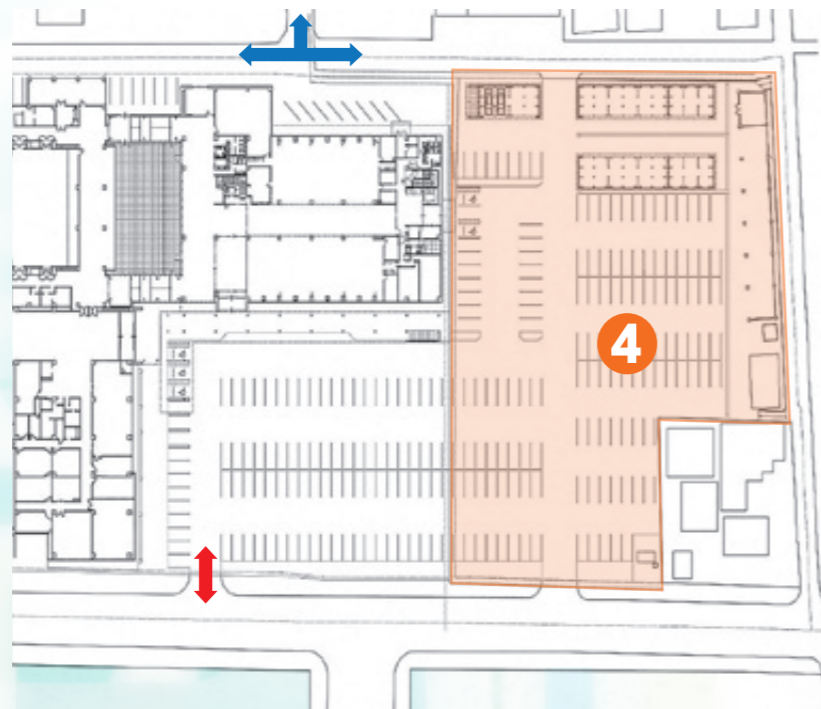

問合せ先 監理課 ☎ 34-8719
