

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年9月23日

計画の名称	越前町における循環のみちの実現									
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	越前町							
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。									
計画の成果目標（定量的指標）	①下水道処理人口普及率を60.4%（H23）から64.4%（H27）に増加させる。									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値		備考				
				当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)		最終目標値 (H27末)			
①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）				60.4%	60.9%	64.4%				
全体事業費	合計 (A+B+C)	132百万円	A	124百万円	B	-	C	8百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	6.1%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本事業の実施主管課である上下水道課で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証するとともに、その要因を分析した。	平成28年度 公表の方法 町ホームページ


1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-3	下水道	一般	越前町	直接	-	汚水	新設	上戸処理区幹線	処理区 A=24ha 管渠 L=0.3km	越前町						26	
1-A-4	下水道	一般	越前町	直接	-	汚水	新設	宮崎東部処理区幹線	処理区 A=64ha 管渠 L=1.0km	越前町						68	
1-A-6	下水道	一般	越前町	直接	-	汚水	新設	気比庄地区	污水管 φ200 L=360m	越前町						30	
合計															124		
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
1-C-2	下水道	一般	越前町	直接	-	新設	污水管枝線整備（気比庄地区）	污水管 φ200 L=260m	越前町						8		
合計															8		
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
1-C-2	基幹事業（1-A-6）である管路施設と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、効率的・効果的に整備を図り、生活環境の改善及び公共用水域の保全に資する。																

※交付対象事業費については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		①下水道未整備地区での管渠整備及び集落排水区域の公共下水道への統合整備を促進したことにより、下水道が利用できる人口が4.8ポイント増加し65.2%となった。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 処理人口普及 率）	最終目標値	64.4%	目標値と実績値 に差が出た要因	統合した処理区における人口が、想定よりも多くなったことにより、普及率が目標より0.8ポイント上回った。
		最終実績値	65.2%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		汚水処理場の統廃合を実施することにより、今後の下水道維持管理における経費・事務等の効率化を進めることができた。			
3. 特記事項（今後の方針等）					
今後も、下水道事業の安定した経営を目指し、汚水処理構想等に基づいた計画的な施設整備を図る。					

計画の名称	越前町における循環のみのちの実現		交付対象	越前町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)			

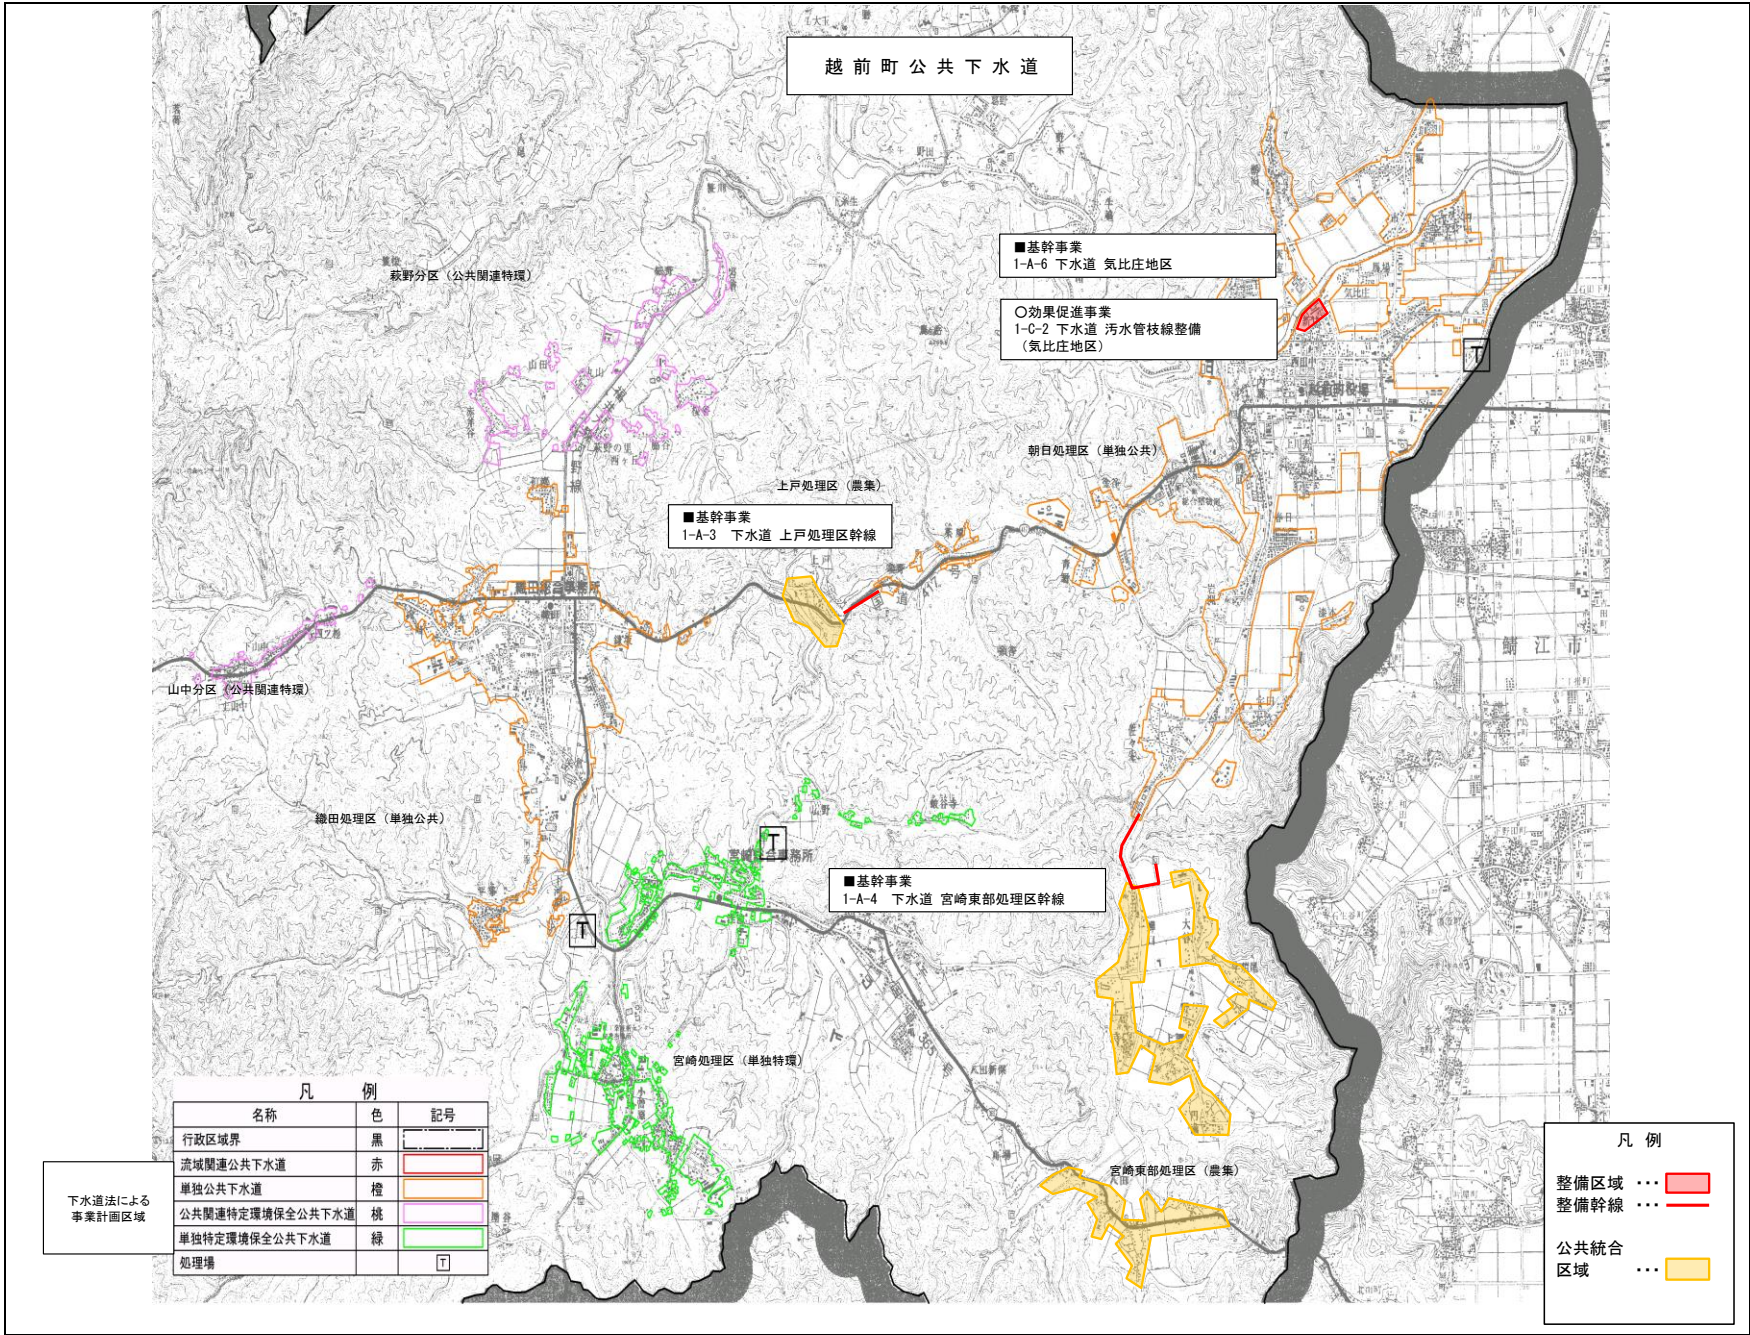

凡 例		
名称	色	記号
行政区境界	黒	—
流域関連公共下水道	赤	—
単独公共下水道	橙	—
公共関連特定環境保全公共下水道	桃	—
単独特定環境保全公共下水道	緑	—
処理場		□

下水道法による  
事業計画区域

凡 例	
整備区域	...
整備幹線	—
公共統合 区域	...
